


**INFORMACIJA
APIE ŠVENČIONIŲ RAJONE
VYKDOMOS
VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS
TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(ITVP) ĮGYVENDINIMĄ
2022 METAIS**

Ataskaita parengta vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“

2023 m.



VILNIAUS REGIONO TIKLSINĖS IR SUSIETOS TERITORIJOS

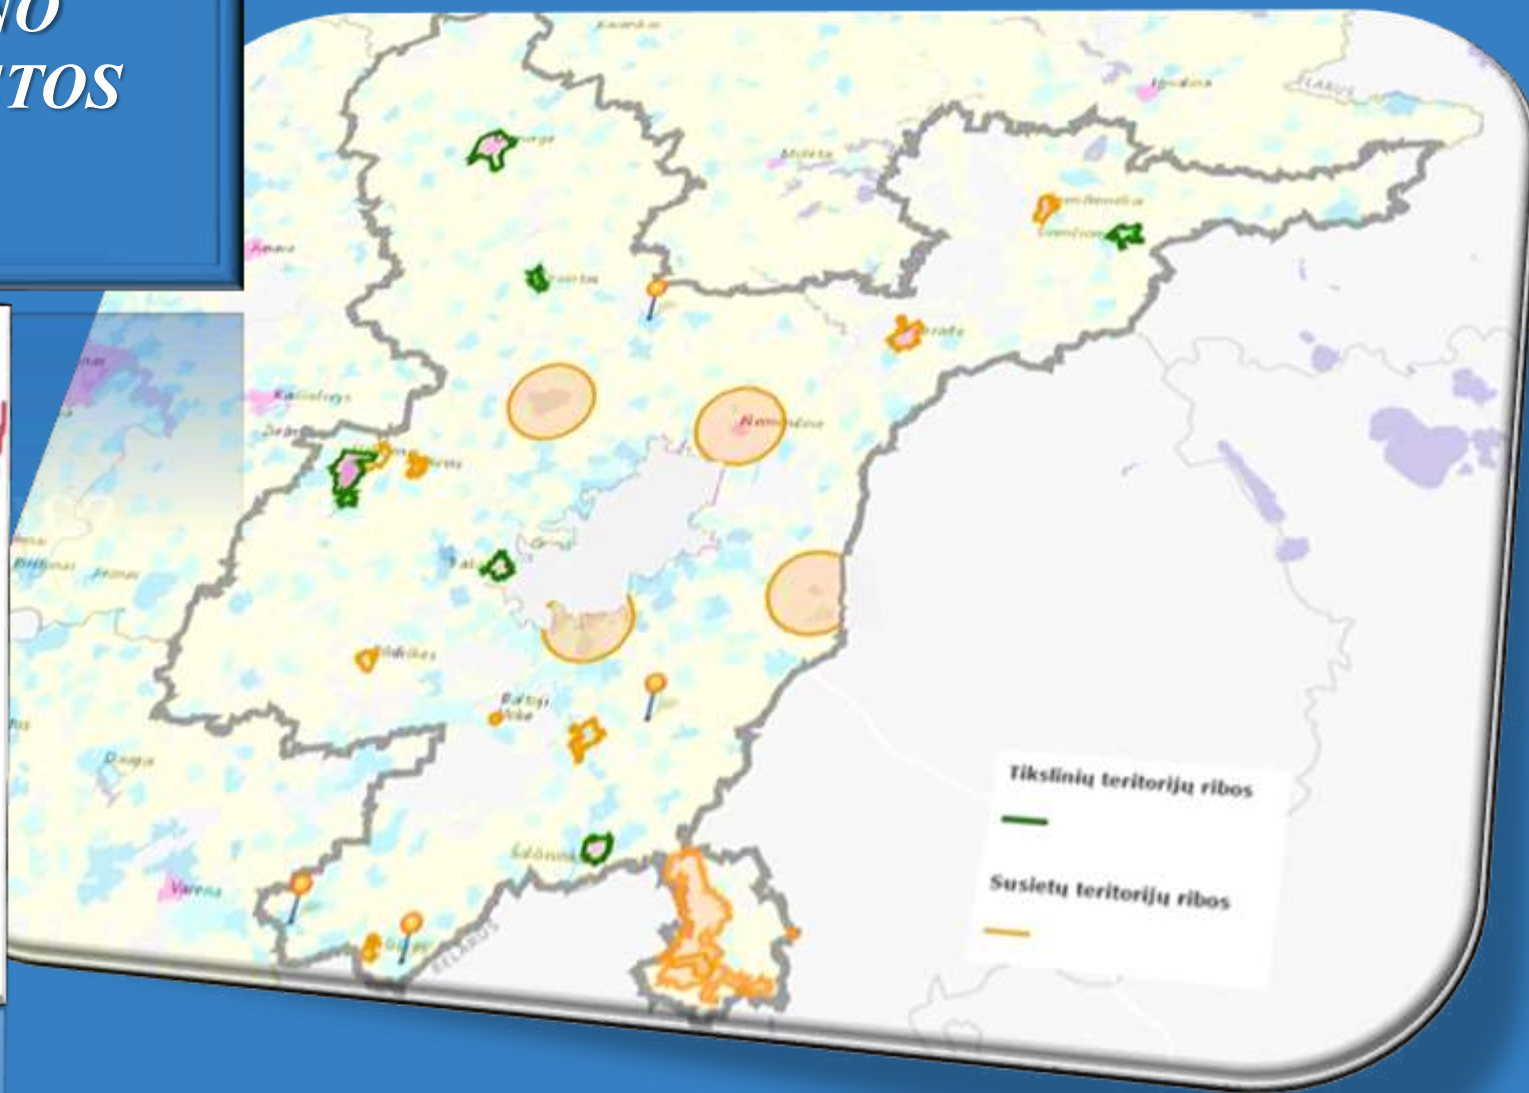

SITUACIJOS ANALIZĖS POKYČIAI

Vilniaus regiono ITVP stiprybėms, silpnybėms (problemoms), galimybėms ir grėsmėms 2022 metais didelį poveikį darė bendroji ekonominė situacija

| <i>STIPRYBĖS</i> | <i>SILPNYBĖS</i> | <i>GALIMYBĖS</i> | <i>GRĖSMĖS</i> |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Daugeliui Vilniaus regione esančių savivaldybių (išskyrus Ukmergės rajono savivaldybę) būdingas santykinai žemas registruoto nedarbo lygis ir (ar) spartus registruoto nedarbo lygio mažėjimas</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Maža materialinių investicijų apimtis ir nediversifikuota šių investicijų struktūra</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>TEN-T koridorių ir europinių magistralių jungčių plėtra šalyje</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Vilniaus regiono ekonominį augimą sustabdys darbo jėgos trūkumas</i> |
| <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Gyventojų skaičius (vertinant viso regiono mastu) santykinai stabilus</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Dideli ekonominio aktyvumo netolygumai</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Paslaugų vartotojų suminės perkamosios galios augimas (dėl gyventojų pajamų augimo ir į Lietuvą atvykstančių turistų srauto augimo)</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Aktyvus aukštas pajamas gaunančių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų persikėlimas į gretimas savivaldybes lems gentrifikacijos procesus ir pažeis ekologinę prasme svarbias teritorijas</i> |
| <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Aukštas artimiausiose Vilniaus miesto priegose esančių Vilniaus regiono dalių investicinis potencialas</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Žemas darbo jėgos aktyvumo lygis</i> | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Mažesnės nekilnojamojo turto kainos skatins rinktis gyvenamąją vietą ne regiono centre (Vilniaus mieste), o aplinkinėse teritorijose esančiose urbanistiniuose centruose</i> | |
| | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Gyventojų skaičiaus mažėjimas miestuose (išskyrus Vilniaus miestą)</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Aktyvi švytuoklinė migracija (lemia didelius CO₂ išmetimus)</i> | | |
| | <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Intensyvi ir dispersiška urbanizacija su Vilniaus miesto savivaldybe besiribojančiose teritorijose</i> | | |


VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANO STRUKTŪRA

TIKSLAS

PADIDINTI UŽIMTŲJŲ SKAIČIŲ VILNIAUS REGIONE, SKATINANT NAUJŲ VIETINIŲ DARBO VIETŲ KŪRIMĄ TIKSLINĖSE IR SUSIETOSE TERITORIJOSE



ŠVENČIONIŲ RAJONE, ĮGYVENDINANT INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMĄ, YRA VYKDOMI 9 VEIKSMAI

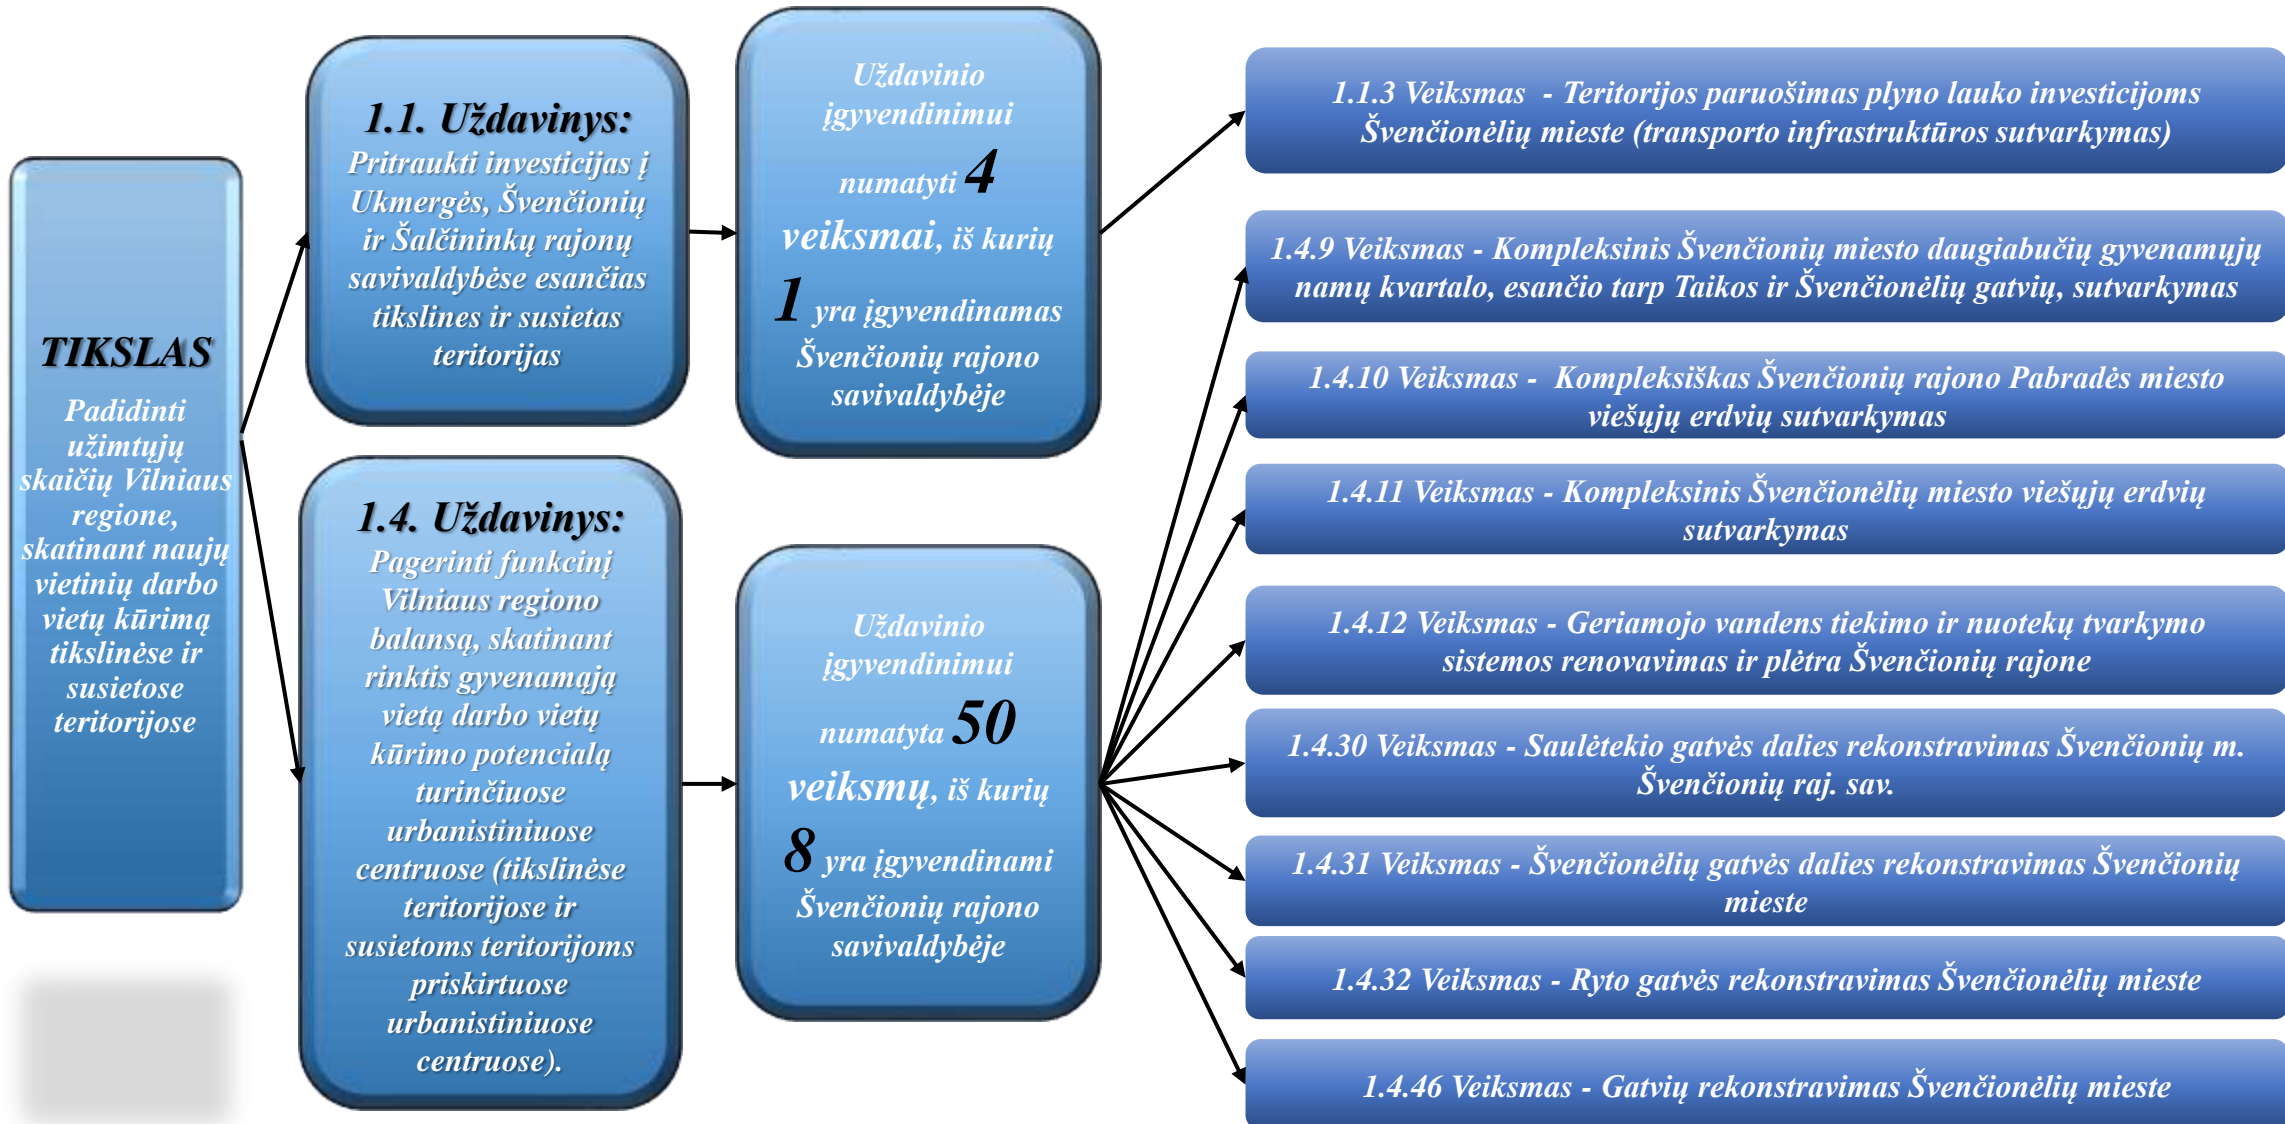

1.1.3 VEIKSMAS

TERITORIJOS PARUOŠIMAS PLYNO LAUKO INVESTICIJOMS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE (TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS)



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP
pasiektas – 0,528 km

Rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|--|
| 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
|----------------|--|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2016 | Pabaiga 2018 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 514 622,17 | VB | 238 975 |
| | Kitos viešosios išlaidos | 275 647,17 |

Švenčionėlių miesto pramonės rajono (plyno lauko) teritorijoje nutiesta nauja Pašaminės gatvė (įrengta važiuojamoji dalis, šaligatvis, apšvietimas). Taip pat, siekiant sudaryti sąlygas saugiai pasiekti plyno lauko teritoriją Žemutinės gatvėje nutiestas šaligatvis su apšvietimu pėsčiųjų eismui organizuoti. Teritorijoje įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai.



1.4.9 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP
 pasiektas – 22 080,52 m²



Rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|--|
| 1.4-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m ² |
|----------------|--|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2017 | Pabaiga 2019 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 666 177,91 | ES | 566 251,21 |
| | VB | 49 963,34 |
| | SB | 49 963,36 |

Projekto įgyvendinimo metu kompleksiskai sutvarkyta daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija. Sutvarkyti privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose, įrengtos penkios vaikų žaidimų ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai. Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai, atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai bei atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai.

Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos.

1.4.10 VEIKSMAS

KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŪJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP
 pasiektas –70 845,70 m²



Rodiklio pavadinimas

1.4-P-5

Produkto vertinimo kriterijus:

Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m²

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

Pradžia
2018

Pabaiga
2020

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|--------------|----|--------------|
| 1 426 416,79 | ES | 1 210 202,49 |
| | VB | 106 782,57 |
| | SB | 109 431,73 |



Projekte įgyvendintos dvi veiklos:

Kompleksiškai sutvarkyta gyvenamoji aplinka šalia daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Vilniaus g. - buvo atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų, šaligatvių dangų rekonstravimo, lietaus nuotekų, daugiafunkcinės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo šaškių stalo, skalbinių džiovinimo aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo/atnaujinimo, suolų su šiukšliadėžėmis įrengimo darbai.

Atnaujinta viešoji erdvė prie Žeimenos upės, pritaikant vietos bendruomenės poreikiams - buvo pašalinti nevertingi krūmai, medžiai, apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, nauji mažosios architektūros elementai (suoliukai su šiukšliadėžėmis, pavėsinė), vaikų žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto aikštelė su aikštelėms būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko stalo teniso stalas, įrengtos lietaus nuotekos, aptvertos visos aikštelės.

1.4.11 VEIKSMAS

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS



**VEIKSMAS
ĮGYVENDINTAS**
Pasiektas rodiklis – 49
581,88 m²



Projekto įgyvendinimo metu buvo numatyta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką Švenčionėlių miesto gyventojams. Projekto metu atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešoji erdvė bei sporto aikštynas prie Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos. Kompleksiškai tvarkant gyvenamąją aplinką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių Švenčionėlių mieste, rekonstruoti pravažiavimo į kiemus keliai, atlikti automobilių stovėjimo aikštelių dangų rekonstravimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai ir šaligatviai bei lietaus nuotekų tinklai. Teritorijoje atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. Įrengtas modernus LED apšvietimas. Lauko gatvės teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė.

Išplėstas aikštynas, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės. Projekto veiklos baigtos.



Rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|--|
| 1.4-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus), m ² |
|----------------|--|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pradžia 2018 | Pabaiga 2022 |
|-------------------------|-------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 404 266,51 | ES | 1 193 530,90 |
| | VB | 105 310,07 |
| | SB | 105 425,54 |

1.4.12 VEIKSMAS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE



VEIKSMAS GYVENDINAMAS

Rodiklio pavadinimas

| | |
|-----------------|--|
| 1.4-P-13 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais |
| 1.4-P-14 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių |
| 1.4-P-15 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais |

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2018 | Pabaiga 2022 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|--------------|------------------------|-------------------|
| 1 480 916,37 | ES | 740 084,39 |
| | SB | 336 857,11 |
| | Privačios lėšos | 403 974,87 |

Visos projekte numatytos veiklos yra užbaigtos. Aplinkos projektų valdymo agentūrai yra pateiktas prašymas dėl papildomo finansavimo veiklai "Vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone" ir dėl projekto pratęsimo, siekiant įsisavinti papildomas ES lėšas.

2022 M. GRUODŽIO MĖNESIO DUOMENIMIS PROJEKTE PASIEKTI RODIKLIAI:

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (Gyventojų skaičius)“ - **102**. Rodiklis pasiektas.

„Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (Gyventojų ekvivalentas)“ - **191**. Rodiklio pasiekimas bus vertinamas 2023 m. rugsėjo 30 d., kadangi projekto veikla „Nuotekų tinklų plėtra Adučiškio gatvėje Švenčionių mieste“ buvo baigta tik 2022 m. lapkričio mėn. ir tik nuo lapkričio mėnesio prasidėjo gyventojų prijungimo prie nuotekų tinklų darbai.

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (Gyventojų skaičius)“ - **2 977**. Kadangi rodiklio nepasiekimo procentas neviršija 5 proc. jis laikomas pasiektu.



1.4.30 VEIKSMAS

SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M. ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP
 pasiektas – 0,63 km

Įgyvendinimo rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|---|
| 1.4-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
|----------------|---|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2017 | Pabaiga 2020 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| 310 464,30 | ES | 263 894,65 |
| | SB | 46 121,95 |
| | Kitos viešosios lėšos | 447,70 |



Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas.

1.4.31 VEIKSMAS

ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
 Rodiklis, numatytas ITVP
 pasiektas – 0,45 km



Rodiklio pavadinimas

1.4-P-9

Produkto vertinimo kriterijus:
 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų
 kelių ilgis, km

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

**Pradžia
 2018**

**Pabaiga
 2019**

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

339 737,97

ES

288 777,27

SB

50 960,70

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai: įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir šaligatvio bortai, šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo priemonės.

1.4.32 VEIKSMAS RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS
Rodiklis, numatytas ITVP
pasiektas – 0,64 km

Rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|--|
| 1.4-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
|----------------|--|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2018 | Pabaiga 2020 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| 331 695,61 | ES | 281 941,26 |
| | SB | 49 270,35 |
| | Kitos viešosios lėšos | 484,00 |



Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas vienpusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema.

1.4.46 VEIKSMAS GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE



VEIKSMAS ĮGYVENDINTAS

Rodikliai, numatyti ITVP pasiekti:
rekonstruotas 1,49 km ilgio kelias ir
įdiegtos 2 saugų eismą gerinančios
priemonės

Rodiklio pavadinimas

| | |
|----------------|--|
| 1.4-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km |
|----------------|--|


| | |
|-----------------|---|
| 1.4-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. |
|-----------------|---|

Veiksmo įgyvendinimo pradžia, pabaiga

| | |
|------------------------|------------------------|
| Pradžia 2019 | Pabaiga 2022 |
|------------------------|------------------------|

Veiksmo įgyvendinimui panaudotos lėšos

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 014 098,43 | ES | 736 949,52 |
| | SB | 134 131,88 |
| | Kitos viešosios lėšos | 143 017,03 |

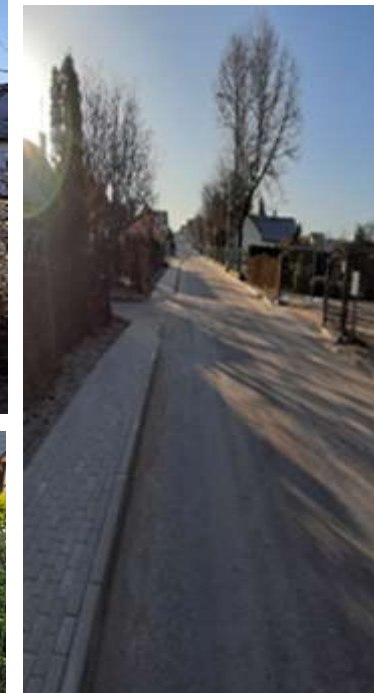

Projekto įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos darbai. Įrengta asfalto danga, nuvažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai, šaligatviai, kelio ženklai. Įdiegtos saugų eismą reguliuojančios ir aplinkosaugos priemonės - 2 vnt.

1.1.3 Veiksmas - Teritorijos paruošimas plyno lauko investicijoms Švenčionėlių mieste (transporto infrastruktūros sutvarkymas)

ĮGYVENDINTAS

1.4.9 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, sutvarkymas

ĮGYVENDINTAS

1.4.10 Veiksmas - Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

ĮGYVENDINTAS

1.4.11 Veiksmas - Kompleksinis Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių sutvarkymas

ĮGYVENDINTAS

1.4.12 Veiksmas - Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone

ĮGYVENDINAMAS

1.4.30 Veiksmas - Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m. Švenčionių raj. sav.

ĮGYVENDINTAS

1.4.31 Veiksmas - Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių mieste

ĮGYVENDINTAS

1.4.32 Veiksmas - Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių mieste

ĮGYVENDINTAS

1.4.46 Veiksmas - Gatvių rekonstravimas Švenčionėlių mieste

ĮGYVENDINTAS



Igyvendinta **88,89**
proc. visų ITVP
veiksmų

IKI 2023 M. PABAIGOS ITVP PLANUOTI IR IKI 2022 M. PABAIGOS PASIEKTI PRODUKTO RODIKLIAI

| <i>PRODUKTO RODIKLIAI</i> | <i>SIEKTINA REIKŠMĖ IKI 2023 M.</i> | <i>PASIEKTA REIKŠMĖ IKI 2022 M. PABAIGOS</i> |
|---|-------------------------------------|--|
| <i>1.1-P-5 Bendros rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</i> | <i>0,528</i> | <i>0,528</i> |
| <i>1.4-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m²</i> | <i>22 080,52</i> | <i>22 080,52</i> |
| <i>1.4-P-5 Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) m²</i> | <i>114 671,58</i> | <i>120 427,58</i> |
| <i>1.4-P-9 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km</i> | <i>3,21</i> | <i>3,21</i> |
| <i>1.4-P-10 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt.</i> | <i>2</i> | <i>2</i> |
| <i>1.4-P-13 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais</i> | <i>100</i> | <i>102</i> |
| <i>1.4-P-14 Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių</i> | <i>3000</i> | <i>2 977</i> |
| <i>1.4-P-15 Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais</i> | <i>287</i> | <i>191</i> |

**PANAUDOTAS FINANSAVIMAS
IKI 2022 METŲ PABAIGOS**



Iš jų:

| | |
|---|--------------------------------|
| <i>ES</i> | <i>5 281 631,69 EUR</i> |
| <i>VB</i> | <i>501 030,98 EUR</i> |
| <i>SB</i> | <i>882 162,62 EUR</i> |
| <i>PRIVAČIOS LĖŠOS</i> | <i>403 974,87 EUR</i> |
| <i>KITOS VIEŠOSIOS LĖŠOS</i> | <i>419 595,90 EUR</i> |

IŠ VISO → ***7 488 396,06 EUR***

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
*Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el. p. savivaldybe@svencionys.lt*
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722

2023 m.

